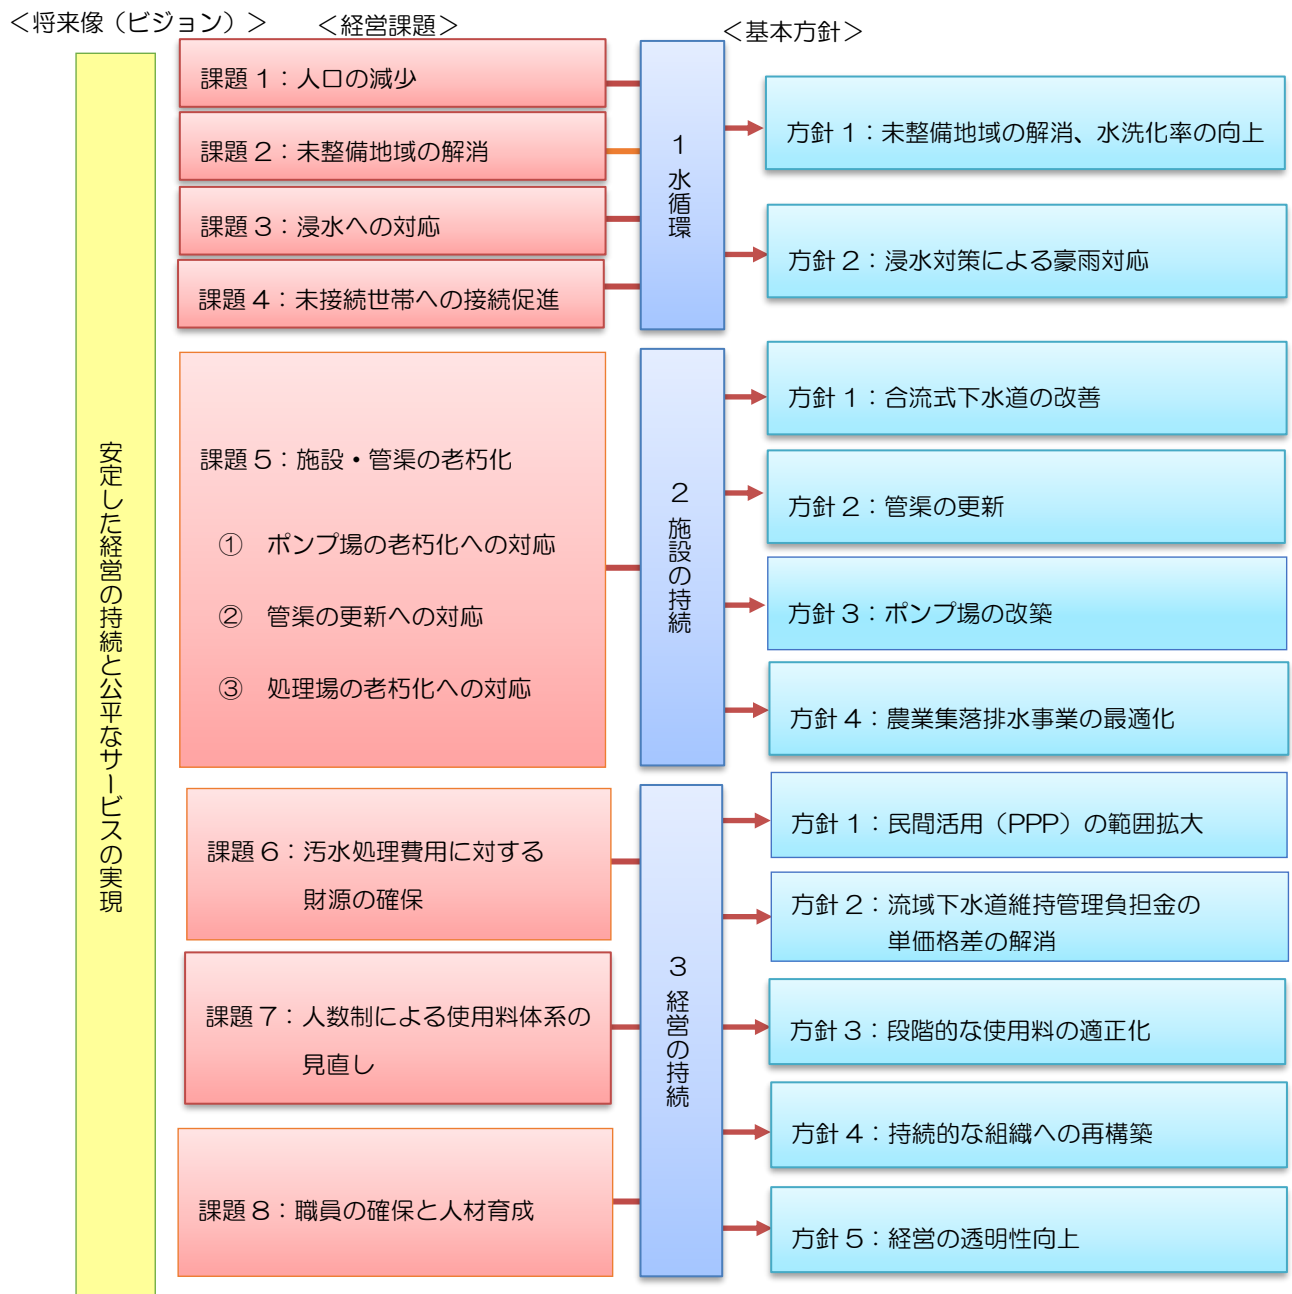


久喜市下水道事業中期経営計画（経営戦略） における令和2年度の取組について

1 基本方針






久喜市下水道事業中期経営計画（経営戦略）（計画期間：平成30年度～令和9年度）（以下、経営戦略と言う。）は、公共下水道事業及び農業集落排水事業の将来像（ビジョン）を「安定した経営の持続と公平なサービスの実現」と定め、これを実現するための基本方針を示したものです。

このたび、令和2年度の決算が確定したことから、令和2年度の取組について、まとめたものです。



2 達成状況及び進捗状況

基本方針：水循環

方針	取組項目		計 画 期 間	
			前 期	後 期
1 水 未 洗 整 化 備 率 地 の 域 向 の 上 解 消、	未整備地域の解消	計画		
		R2 進捗状況	生活環境の改善や公共水域の水質保全を図るため、未整備地域に下水道管を敷設し、5.2haの供用を開始した。その結果、整備率は85.3%となり、令和元年度末と比べ0.2ポイント上昇した。	
	未接続世帯への 接続促進	計画		
		R2 進捗状況	未接続世帯1,516戸に対して接続促進の通知を発送し、公共下水道への早期接続の促進に努め、176戸の接続替えがあった。	
2 対 浸 水 対 策 に よ る 豪 雨	連携体制の構築	計画		
		R2 進捗状況	コロナ禍により書面にて、久喜市河川・下水道事業調整協議会を開催した。	
	雨水調整池の整備	計画		
		R2 進捗状況	東田調整池基本設計及び地質調査を実施した。	

定量目標【参考】

整備率の目標

(単位：%)

指 標		前 期					後 期				
整備率 (公共下水道)	目標	87.2					90.0				
		H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	実績	84.8	85.1	85.3	—	—	—	—	—	—	—

※整備率：公共下水道を整備する計画面積のうち、整備が終了している面積の占める割合。




水洗化率の目標

(単位：%)

指 標		前 期					後 期				
水洗化率 (公共下水道)	目標	94.9					95.3				
		H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	実績	94.8	93.7	93.2	—	—	—	—	—	—	—
指 標		前 期					後 期				
水洗化率 (農業集落排水)	目標	83.4					83.5				
		H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	実績	82.1	85.5	89.1	—	—	—	—	—	—	—

※水洗化率：公共下水道または農業集落排水に接続可能な人口のうち、実際に接続をしている人口の占める割合。

基本方針：施設の維持

方針	取組項目		計 画 期 間	
			前 期	後 期
1 道 合 の 流 改 式 善 下 水	合流式下水道の 分流化	計画		
		R2 進捗状況	久喜市合流式下水道改善基本計画検討業務を実施し、実施方法等の方向性の検討を行った。	
2 管 渠 の 更 新	管渠の点検・調査	計画		
		R2 進捗状況	久喜市公共下水道ストックマネジメント計画に基づき、腐食環境下の管渠を優先してカメラ調査を実施した。	
	更新工事の実施	計画		
		R2 進捗状況	管渠の点検・調査により、実施する工事がなかったため、工事は実施していない。	

方針	取組項目		計 画 期 間			
			前 期	後 期		
3 ポ ン プ 場 の 改 築	汚水ポンプ場の 長寿命化計画策定	計画	下新井	上内	吉羽	
		R2 進捗状況	施設ごとの長寿命化計画に代わり、新たに交付金の要件となった、下水道施設全体を包括した下水道ストックマネジメント計画（令和元年度～令和5年度）を平成30年度に策定し、その中で下新井中継ポンプ場と上内中継ポンプ場の改築を計画した。 【H30に前期計画分完了】			
	汚水ポンプ場の 改築	計画	北	下新井	上内	吉羽
		R2 進捗状況	令和元年度から令和2年度の継続事業として北中継ポンプ場更新工事(第3期)を実施した。			
	雨水ポンプ場の 長寿命化計画策定	計画	桜田	久喜菖蒲	清久	
		R2 進捗状況	施設ごとの長寿命化計画に代わり、新たに交付金の要件となった、下水道施設全体を包括した下水道ストックマネジメント計画（令和元年度～令和5年度）を平成30年度に策定し、その中で桜田雨水ポンプ場と久喜菖蒲工業団地雨水ポンプ場の改築を計画した。【H30に前期計画分完了】			
	雨水ポンプ場の 改築	計画	吉羽	桜田	久喜菖蒲	清久
		R2 進捗状況	吉羽雨水ポンプ場流入ゲート更新等工事を実施した。			

方針	取組項目		計 画 期 間		
			前 期	後 期	
4 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 の 最 適 化	農業集落排水 処理施設の改築	計画	除堀	太田袋	丸谷・神ノ木
		R2 進捗状況	太田袋地区について、機能強化工事にあたり国の補助対象の採択に必要な計画概要書を作成した。		
	公共下水道への 接続の計画策定	計画	北中曽根	北青柳、塚田	六万部
		R2 進捗状況	最適整備構想計画を策定し、公共下水道へ接続する地区を検討した。		
	公共下水道への 接続	計画	北中曽根	北青柳、塚田	六万部
		R2 進捗状況	北中曽根地区の公共下水道接続工事を実施し、令和3年度から公共下水道へ接続することとした。		
	最適整備構想計画 の策定	計画	計画策定		
		R2 進捗状況	最適整備構想計画を策定した。		

基本方針：経営の持続

方針	取組項目		計 画 期 間	
			前 期	後 期
1 大 小 （民間活用の範囲）	業務委託の包括化と範囲の拡大	計画	調査・検討	実施
		R2 進捗状況	通常業務の中で、外部委託可能な業務の洗い出しを行った。	
2 消 流 担 域 金 の 下 の 水 単 道 価 管 格 理 差 の 負	流域下水道維持管理負担金の適正化	計画	連携促進	
		R2 進捗状況	他団体と流域下水道維持管理負担金単価の積算にあたっての課題等を共有した。	
3 の 段 適 階 正 的 化 な 使 用 料	使用料の適正化	計画	検討・審議	見直し
		R2 進捗状況	検討・審議	見直し
4 の 持 再 続 構 的 築 な 組 織 へ	組織再構築	計画	検討	
		R2 進捗状況	業務の効率化、業務内容の見直しを実施するため、令和元年度から経営部門を水道事業と統合した。【R1に完了】	
5 経 営 の 透 明 性 の 向 上	農業集落排水事業の地方公営企業法適用	計画	検討・実施	
		R2 進捗状況	農業集落排水事業の資産評価を実施し、令和3年度から地方公営企業法を適用することとした。	
	経営の透明性向上	計画	検討・実施	
		R2 進捗状況	公共下水道事業の令和元年度貸借対照表および損益計算書（決算書）をホームページに掲載した。 また、公共下水道および農業集落排水事業の令和元年度決算を分析した経営比較分析表を作成し、ホームページに掲載した。	
