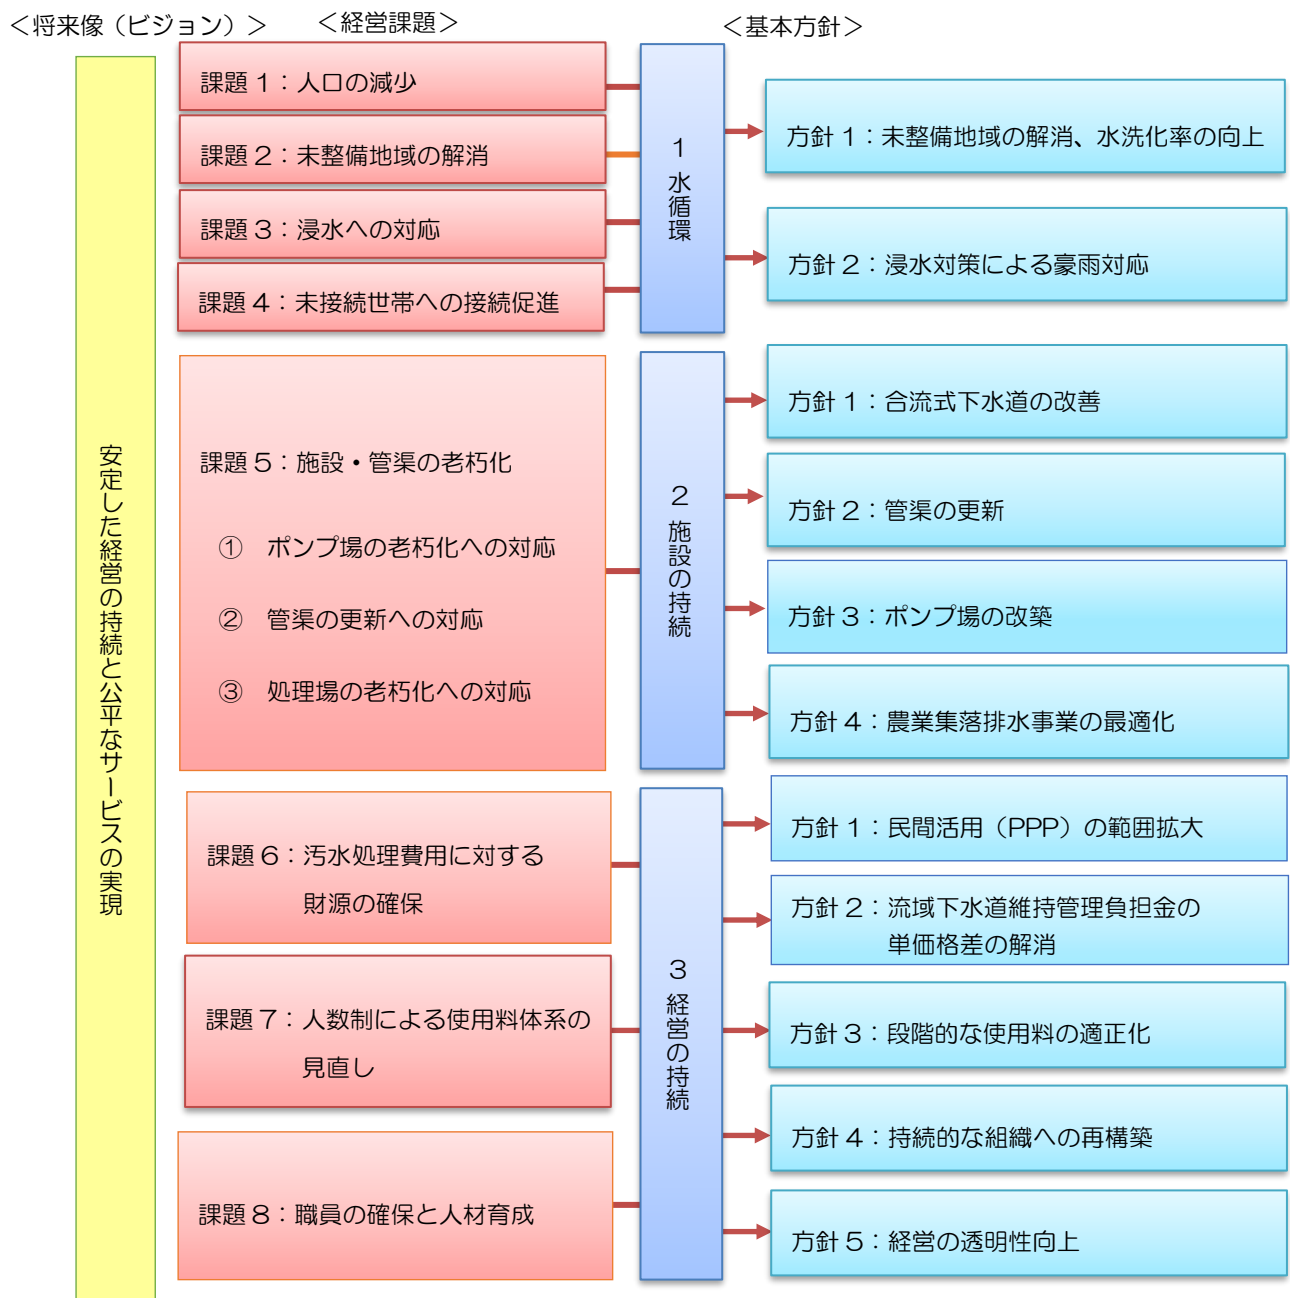


久喜市下水道事業中期経営計画（経営戦略） における令和3年度の取組について






1 基本方針

久喜市下水道事業中期経営計画（経営戦略）（計画期間：平成30年度～令和9年度）（以下、経営戦略と言う。）は、公共下水道事業及び農業集落排水事業の将来像（ビジョン）を「安定した経営の持続と公平なサービスの実現」と定め、これを実現するための基本方針を示したものです。



2 達成状況及び進捗状況

基本方針：水循環

方針	取組項目		計 画 期 間	
			前 期	後 期
水 未 洗 整 化 備 率 地 の 域 向 の 上 解 消 、	未整備地域の解消	計画		
		R3 進捗状況	公衆衛生の向上や公共用水域の水質保全を図るため、未整備地域に下水道管を敷設し、8.3haの供用を開始した。その結果、整備率は85.9%となり、令和2年度末と比べ0.6ポイント上昇した。	
	未接続世帯への 接続促進	計画		
		R3 進捗状況	公共下水道への早期接続のため、未接続世帯1,438戸に対して、接続促進の通知を送付したところ、188戸の接続替えがあった。	
対 浸 水 対 策 に よ る 豪 雨	連携体制の構築	計画		
		R3 進捗状況	久喜市河川・下水道事業調整協議会を開催した。 (コロナ禍により書面開催)	
	雨水調整池の整備	計画		
		R3 進捗状況	農林水産省が管轄する中川上流地区国営事業の湛水防除対策において、中川と合流する大堀排水路にゲート付貯留施設の整備が検討されており、国の計画に併せて調整池の規模を再検討する必要があることから、令和3年度は実施を見送っている。	

定量目標【参考】

整備率の目標

(単位：%)

指 標		前 期					後 期				
整備率 (公共下水道)	目標	87.2					90.0				
		H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	実績	84.8	85.1	85.3	85.9	—	—	—	—	—	—

※整備率：公共下水道を整備する計画面積のうち、整備が終了している面積の占める割合。

水洗化率の目標

(単位：%)

指 標		前 期					後 期				
水洗化率 (公共下水道)	目標	94.9					95.3				
		H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	実績	94.8	93.7	93.2	93.5	—	—	—	—	—	—
指 標		前 期					後 期				
水洗化率 (農業集落排水)	目標	83.4					83.5				
		H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	実績	82.1	85.5	89.1	89.5	—	—	—	—	—	—

※水洗化率：公共下水道または農業集落排水に接続可能な人口のうち、実際に接続をしている人口の占める割合。

基本方針：施設の持続

方針	取組項目		計 画 期 間	
			前 期	後 期
道 合 の 流 改 式 善 下 水	合流式下水道の 分流化	計画		
		R3 進捗状況	久喜市合流式下水道改善基本計画を策定し、複数の整備手法における概算工事費を算出した。	
管 渠 の 更 新	管渠の点検・調査	計画		
		R3 進捗状況	久喜市下水道ストックマネジメント計画における管渠の健全度等に基づき、カメラ調査・点検を実施した。	
	更新工事の実施	計画		
		R3 進捗状況	令和4年度の工事に向けて、布設替工事（1路線）及び更生工事（1路線）の実施設計を行った。	

方針	取組項目		計 画 期 間			
			前 期		後 期	
ポン プ 場 の 改 築	汚水ポンプ場の 長寿命化計画策定	計画	下新井	上内	吉羽	
		R3 進捗状況	施設ごとの長寿命化計画に代えて、下水道施設全体を包括した下水道ストックマネジメント計画（令和元年度～令和5年度）を平成30年度に策定した。 【H30に完了】			
	汚水ポンプ場の 改築	計画	北	下新井	上内	吉羽
		R3 進捗状況	下新井中継ポンプ場について、耐震詳細診断及び修繕改築計画・浸水対策基本設計業務を実施した。			
	雨水ポンプ場の 長寿命化計画策定	計画	桜田	久喜菖蒲	清久	
		R3 進捗状況	施設ごとの長寿命化計画に代えて、下水道施設全体を包括した下水道ストックマネジメント計画（令和元年度～令和5年度）を平成30年度に策定した。 【H30に完了】			
	雨水ポンプ場の 改築	計画	吉羽	桜田	久喜菖蒲	清久
		R3 進捗状況	令和4年度の工事に向けて、桜田雨水ポンプ場の実施設計を行った。			

方針	取組項目		計 画 期 間		
			前 期	後 期	
農 業 集 落 排 水 事 業 の 最 適 化	農業集落排水 処理施設の改築	計画	除堀	太田袋	丸谷・神ノ木
		R3 進捗状況	令和4年度から令和5年度に行う太田袋地区機能強化工事に向けて、実施設計を行った。		
	公共下水道への 接続の計画策定	計画	北中曽根	北青柳、塚田	六万部
		R3 進捗状況	令和2年度に農業集落排水最適整備構想を策定した。【R2に完了】		
	公共下水道への 接続	計画	北中曽根	北青柳、塚田	六万部
		R3 進捗状況	北青柳地区と塚田地区の公共下水道接続に向けた関係機関との協議を令和4年度から開始するため、埼玉県とスケジュールを確認した。		
最適整備構想計画 の策定	計画	計画策定			
	R3 進捗状況	令和2年度に農業集落排水最適整備構想を策定した。【R2に完了】			

基本方針：経営の持続

方針	取組項目		計 画 期 間	
			前 期	後 期
大 小 (民間活用) の範囲	業務委託の包括化と範囲の拡大	計画	調査・検討	実施
		R3進捗状況	通常業務の中で、外部委託可能な業務の調査・検討を実施した。	
流域下水道維持管理の単価管理	流域下水道維持管理負担金の適正化	計画	連携推進	
		R3進捗状況	流域下水道維持管理負担金の単価格差是正について、県への要望を実施した。	
段階的な使用料の適正化	使用料の適正化	計画	検討・審議	見直し
		R3進捗状況	令和2年度に審議会から答申を得た下水道使用料の改定については、実施時期の審議が改めて必要とされていたが、新型コロナウイルスによる市民生活への影響を鑑み、令和3年度は見送りとした。	
持続的な組織への再構築	組織再構築	計画	検討	
		R3進捗状況	業務の効率化、業務内容の見直しを実施するため、令和元年度から経営部門を水道事業と統合した。【R1に前期計画分完了】	
経営の透明性向上	農業集落排水事業の地方公営企業法適用	計画	検討・実施	
		R3進捗状況	令和3年度から地方公営企業法の財務規定等を適用した。【R3に完了】	
	経営の透明性向上	計画	検討・実施	
		R3進捗状況	公共下水道事業及び農業集落排水事業の令和2年度決算書、経営比較分析表をホームページに掲載した。	
